



#Moderný magistrát

#Pre Bratislavčanky a Bratislavčanov

„Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ Stav prípravy projektu

Prezentácia pre poslancov MsZ

09. 06. 2021

NS MHD 2 - Základné informácie (predpokladané termíny)

Realizácia stavebných prác



Podpis Zmluvy o Dielo 09/2021

- Ponuky predložené 22.3.2021
- Prebieha vyhodnocovanie ponuky s najnižšou cenou



Stavebné práce - trvanie 27 mesiacov

- Predpoklad ukončenia stavebných prác 12/2023



31. 12. 2023

- Plánované ukončenie projektu vrátane ukončenia stavebných prác a finančné ukončenie projektu

Zabezpečenie financovania



Predloženie žiadosti o NFP 10/2021

- Predpokladaný dátum podpisu Zmluvy o NFP na základe schválenej Žiadosti o NFP – 02/2022.
- Časový súlad získania externých finančných zdrojov z EÚ pred začiatkom fakturácie prác zhotoviteľom:
- 1. faktúra až po preinvestovaní 8 mil. EUR – predpoklad 02/2022

Riadenie projektu



Stavebný dozor


- Výkon stavebného dozoru bude realizovať spoločnosť Metro Bratislava, a.s. na základe in-house zadania zákazky v súlade so zákonom o Verejnom obstarávaní.



Projektový manažment

- Status prioritného projektu
- Projektové riadenie - organizačná štruktúra projektu a definované role
- Projektový tím

Projektový tím

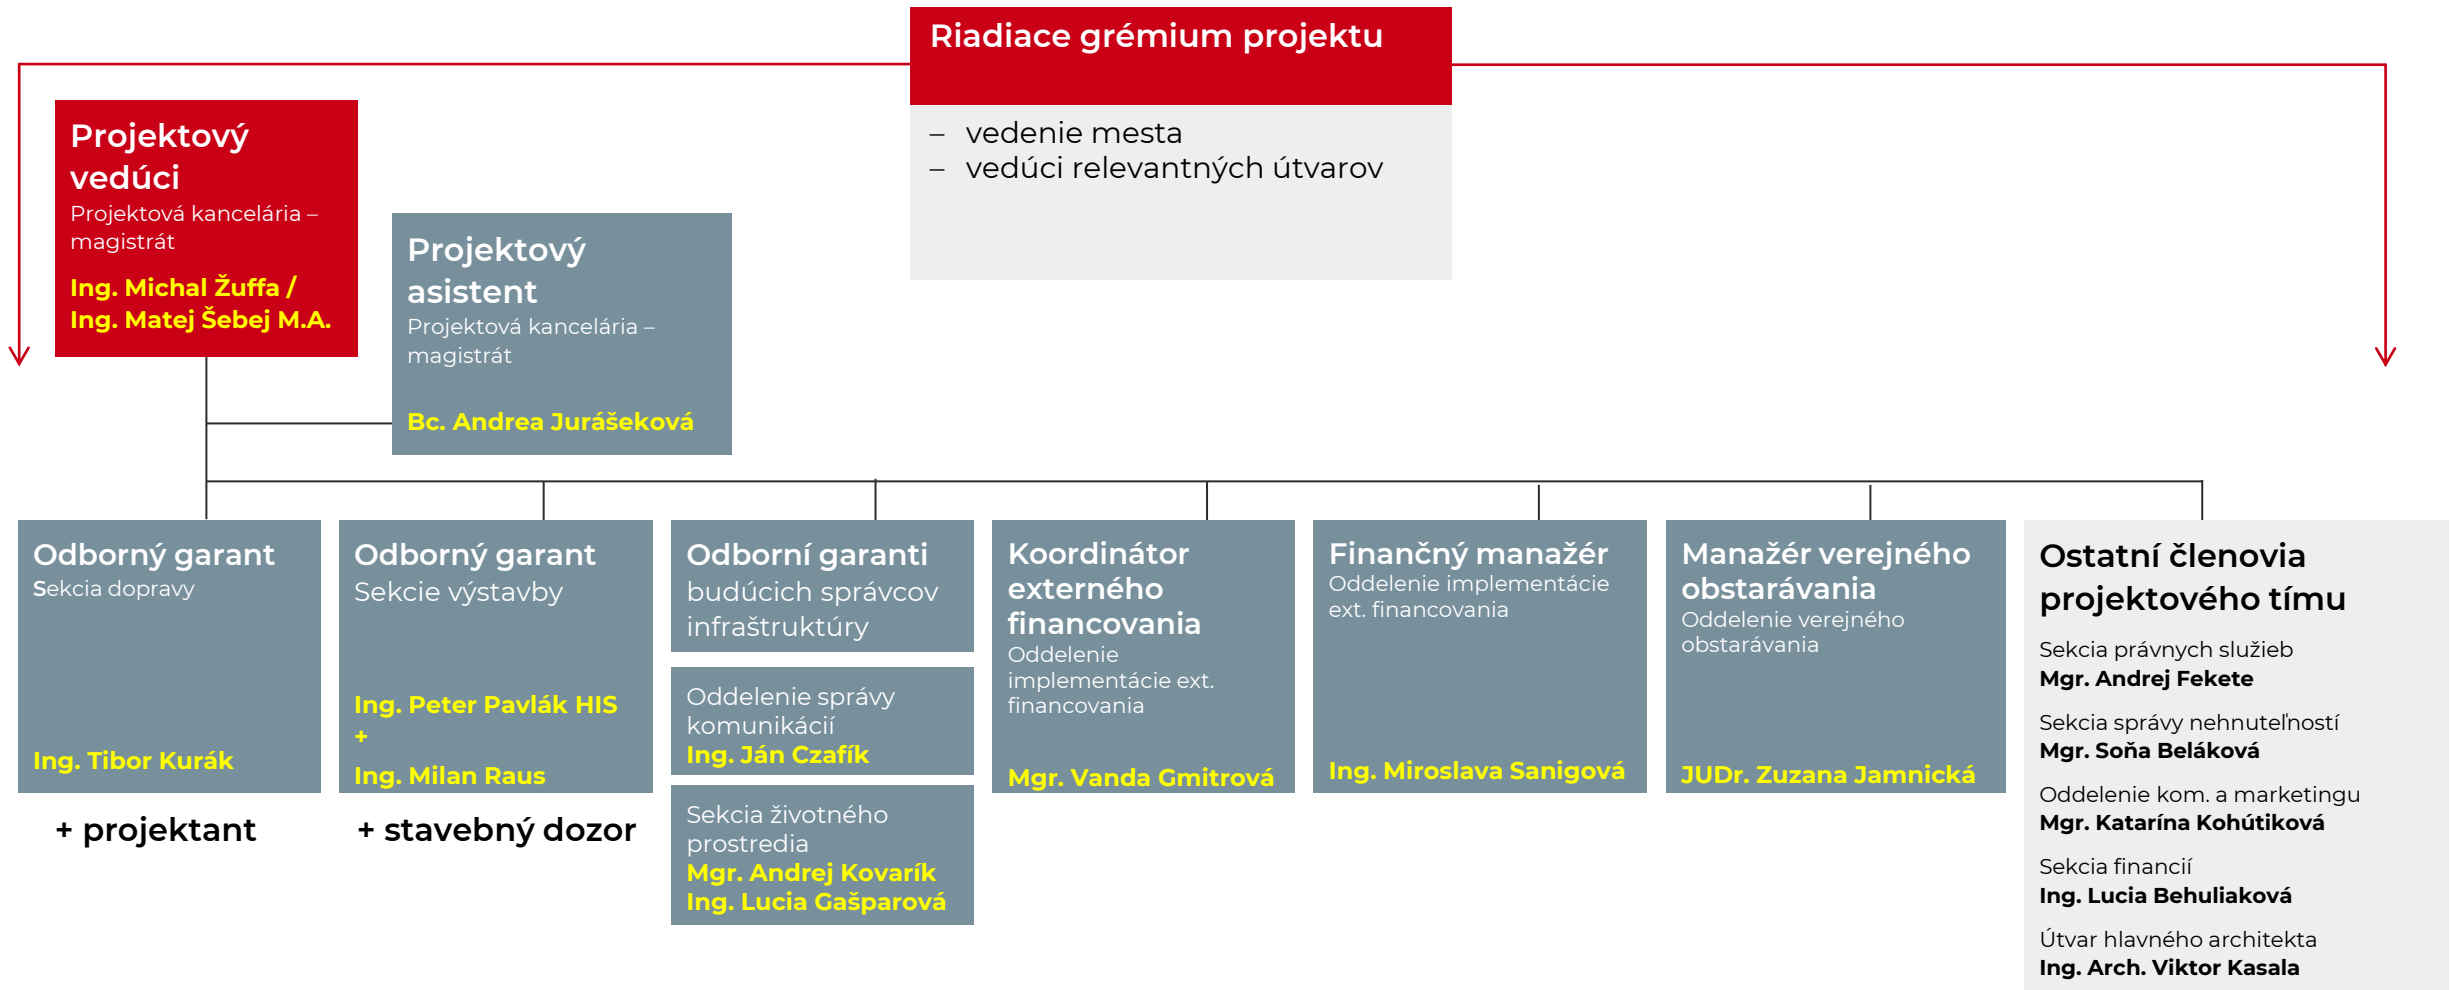

Stav prípravy výstavby projektu / **Next steps**

Verejné obstarávanie - práce

- Vyhodnotenie ponuky uchádzača s najnižšou ponukou (06/2021)
- **Predloženie procesu verejného obstarávania na kontrolu na RO OPII a ÚVO**
- **Po schválení podpis Zmluvy o Dielo (09/2021)**

Stavebný dozor

- Príprava zmluvy na služby stavebný dozor
- **Prieskum trhu pre účely preukázania hospodárnosti pri zadaní in-house zákazky**
- **Ex-ante kontrola postupu zadania zákazky pre in-house stavebný dozor (RO OPII)**

NATURA 2000

- Žiadosť o vydanie stanoviska OÚ BA resp. Štátnej ochrany prírody (ŠOP) predložená na OÚ v r. 2020
- **Ciele ochrany**
 - **nutné zadefinovať (ŠOP)**
 - **Schváliť na národ. úrovni (MŽP)**

Stavebné povolenia

- SP MČ Bratislava - Petržalka
- SP Špec. stavebný úrad HM BA
- SP OÚ Bratislava
- SP BSK
- **SP MČ Bratislava - Petržalka (Stavebné objekty v správe ZS Distribučnej) 07/2021**

EIA – Oznámenie o zmene

- Žiadosť predložená na OÚ BA v 12/2020
- Vydané rozhodnutie , že zmena projektu sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov projektu na životné prostredie - právoplatnosť nadobudnutá 05/2021

Stav verejného obstarávania na zhotoviteľa diela / **Next steps**

- Ponuky predložené 22.3.2021
- Prebieha hodnotenie ponuky s najnižšou cenou – záverečná fáza

Next steps:

- **Vyhodnotenie ponuky – predpoklad 06/2021**
- **V prípade pozitívneho vyhodnotenia ponuky s najnižšou cenou - Predloženie dokumentácie z procesu verejného obstarávania na kontrolu na RO OPII a ÚVO**
- **Po schválení podpis Zmluvy o Dielo - predpoklad 09/2021**

Externé financovanie – Žiadosť o poskytnutie NFP

Žiadosť o NFP

- Veľký projekt nad 75 mil. EUR, preto schvaľovanie aj na EK
- Schvaľovanie na RO OPII
- Intenzita pomoci: **95% NFP** (oprávnené výdavky)
- **5% vlastné zdroje**

Indikatívny rozpočet projektu:

- **126 950 800 EUR** celkom OV
- **120 603 260 EUR NFP (EÚ zdroje a štátny rozpočet)**
- **6 347 540 EUR** vlastné zdroje
- Indikatívny rozpočet zohľadňuje náklady v zmysle PHZ a bude aktualizovaný na základe výsledkov verejných obstarávaní

Systém financovania

- Eliminácia problémov s cash-flow prostredníctvom zmeneného systému financovania
- Možné uplatniť **Systém predfinancovania**
- Vyššie nároky na urgentný finančný manažment

Informačný kontajner

- Výdavky na obstarania info kontajnera **financované** z externých zdrojov
- Podmienka oprávnenosti:
 - Postup verejného obstarávania
 - Komunikácia a marketing s prvkami EÚ financovania

Personálne výdavky

- Výdavky na interné riadenie projektu pre kľúčové pozície tímu **financované** z projektu do stanoveného limitu
- Podmienka mesačnej evidencie výkazu prác jednotlivých pozícií
- Max. limit pre všetky pozície pri 100% úväzku: **508 255 EUR**

Majetko-právne vysporiadanie

- Výdavky na výkup pozemkov a prenájom pozemkov počas výstavby **financované** z externých zdrojov
- Oprávnené výdavky MPV vo výške **2 957 123 EUR**

Stav zabezpečenia externého financovania / **Next steps**


- Prebieha príprava Žiadosti o NFP / Informácie o veľkom projekte pre EK/Jaspers a RO OPII
- Pravidelné stretnutia a konzultácie s RO OPII na týždennej báze
- Konzultácie s EIB/Jaspers pri príprave Žiadosti o NFP
- Príprava podkladov na vyzvanie pre RO OPII.

Next steps:

- **Obstaranie Nákladovo – výnosovej analýzy projektu**
- **Obstaranie Analýzy vplyvu klmatickej zmeny na projekt**
- **Vydanie vyjadrenie príslušného orgánu k vplyvu projektu na územia NATURA 2000**
- **Predloženie dokumentácie ku všetkým povoloacím procesom a vyjadreniam pre tzv. Compliance check**
- **Zpracovanie výstupov analýz, NATURA 2000 a Compliance check do Žiadosti o poskytnutie NFP**
- **Predloženie informácie o veľkom projekte na EIB/Jaspers v 10/2021**
- **Na základe vydaného Action Completion Note (Jaspers) predloženie ŽoNFP na RO OPII 12/2021**
- **Predpoklad podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP 02/2022**

NS MHD2

Harmonogram

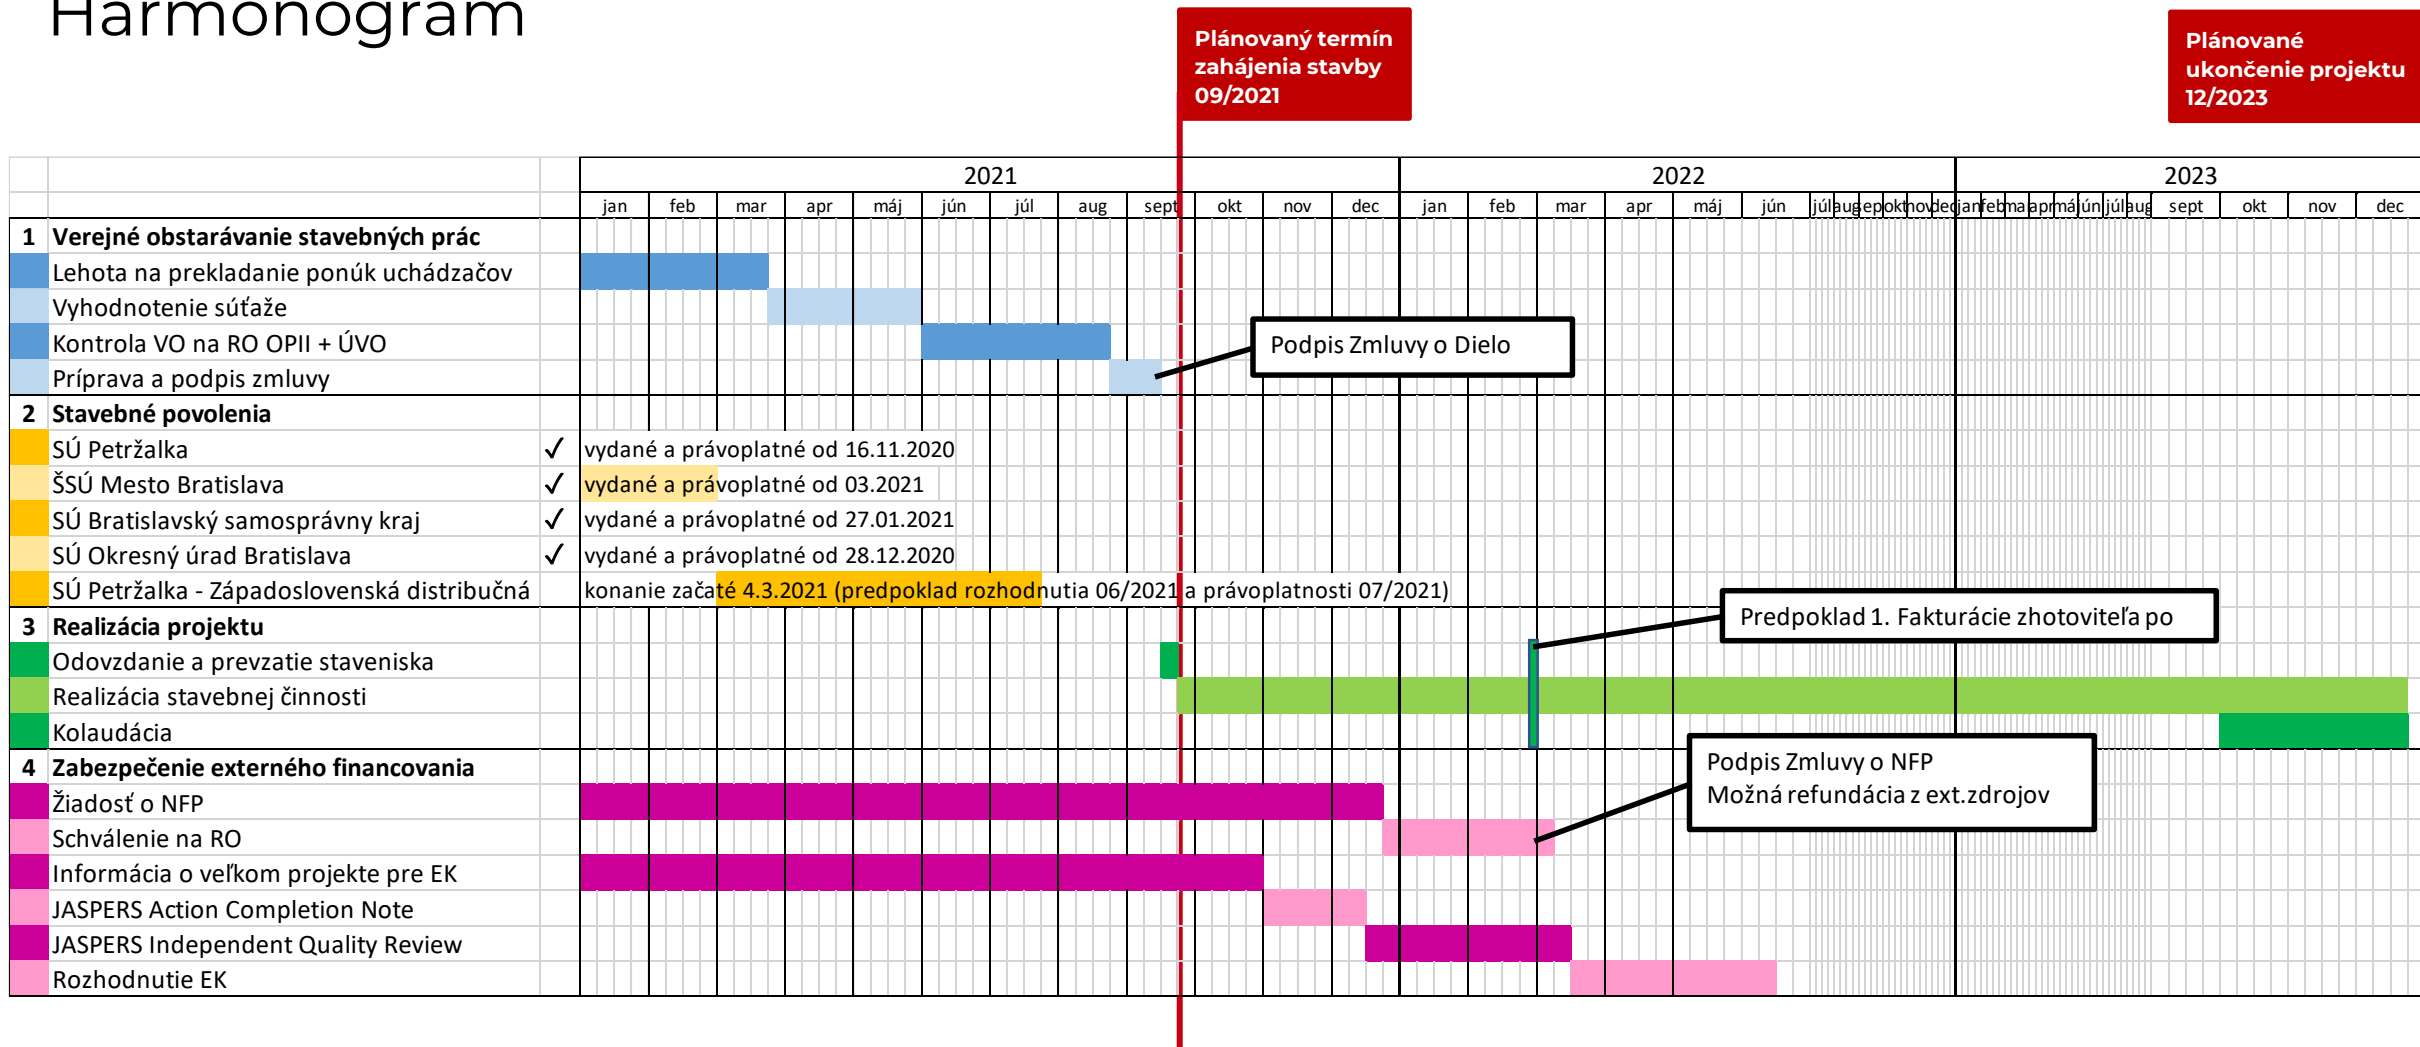

Plánovaný termín zahájenia stavby 09/2021

Plánované ukončenie projektu 12/2023

Podpis Zmluvy o Dielo

Predpoklad 1. Fakturácie zhotoviteľa po

Podpis Zmluvy o NFP
Možná refundácia z ext.zdrojov
